Sprint 1 - HYDRA

Inicio: 19-10-2026

Finalizó: 3-11-2026

Retrospectiva:

Durante el primer Sprint se logró establecer una base funcional para el desarrollo de TekniGO, así como organizar el trabajo del equipo mediante la metodología Scrum y la gestión de historias de usuario en Jira.

Aspectos positivos:

- Se estableció la arquitectura inicial del sistema y se configuraron las herramientas necesarias para el desarrollo.
- Se logró integrar el trabajo del equipo utilizando GitHub como repositorio compartido.
- Se implementó un pipeline de CI/CD para ejecutar verificaciones automáticas del frontend y backend.
- Se mantuvo comunicación entre los integrantes para resolver problemas técnicos y coordinar las tareas asignadas.
- Se logró desplegar el proyecto.

Dificultades encontradas:

- Se presentaron inconvenientes durante la configuración inicial de los entornos de desarrollo y servicios externos.
- Surgieron errores de integración entre frontend y backend, principalmente relacionados con autenticación y configuración de CORS.
- Algunas tareas requirieron más tiempo del estimado debido a la complejidad técnica y las dependencias entre funcionalidades.
- Fue necesario realizar ajustes durante el desarrollo para mejorar la integración de los componentes.

Acciones de mejora para el siguiente Sprint:

- Mejorar la estimación de las historias de usuario y dividir las tareas complejas en subtareas más pequeñas.
- Realizar pruebas de integración con mayor frecuencia.
- Mantener actualizada la documentación técnica y los estados de las tareas en Jira.
- Coordinar anticipadamente las funcionalidades que dependan del trabajo de otros integrantes.
- Priorizar la estabilidad de las funcionalidades implementadas antes de incorporar nuevas características.
- Agregar ejecución de tests al pipeline de CI.
- Mejorar documentación de arquitectura y stack de tecnologías.

Review:

Durante el Sprint 1 se avanzó en la construcción de las funcionalidades principales de TekniGO.

Resultados principales:


- Implementación de la estructura inicial del frontend con React y Vite.
- Desarrollo del backend utilizando Python y FastAPI.
- Configuración de la base de datos PostgreSQL mediante Supabase.
- Integración de Firebase Authentication para la gestión de autenticación.
- Desarrollo de funcionalidades iniciales relacionadas con el registro y la gestión de usuarios.
- Configuración de migraciones de base de datos mediante Alembic.
- Implementación de verificaciones automáticas mediante GitHub Actions.
- Despliegue del frontend en Vercel y del backend en Render.
- Integración inicial de los módulos desarrollados por los integrantes del equipo.

Resultado del Sprint:

Se obtuvo una primera versión funcional y desplegada de TekniGO, con una arquitectura establecida y componentes integrados que servirán como base para las funcionalidades de los siguientes Sprints.

Aunque se alcanzaron avances importantes, todavía existen funcionalidades pendientes de completar, validar y mejorar, especialmente las relacionadas con la verificación de identidad y los procesos de contratación, que continuarán desarrollándose en los próximos Sprints.

Velocidad:

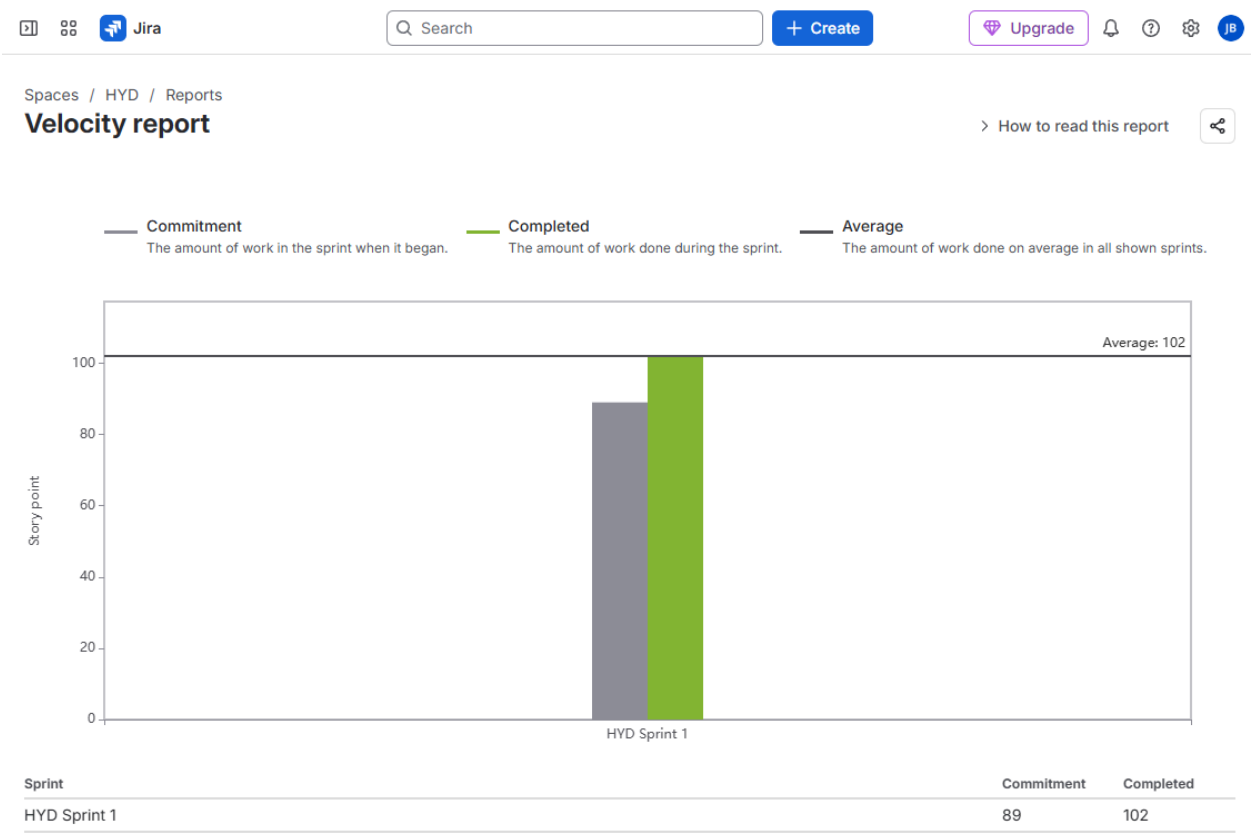

Sprint	Commitment	Completed
HYD Sprint 1	89	102

Sprint 2:

Inicia: 4-11-2026

Finaliza: 15-11-2026
